



Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Beschlussauszug
aus der
Sitzung des Regionalentwicklungsausschusses
vom 21.05.2025

Top 5 Bericht über den Sachstand Lindaunis-Brücke



Regionalentwicklung- ausschuss

Status quo Neubau Schleibrücke Lindaunis

21. Mai 2025 | Rendsburg

Durchgeführte Arbeiten

Neubau | 2024

- Herstellung Pfeiler 3 für Los 2 vorbereitet und abgeschlossen
- Herstellung Widerlager für Los 2 und Sicherungswände fertiggestellt
- Herstellung Rohbau Betriebsgebäude hat begonnen
- Abschluss der Planung und Ausschreibung Los 2



Quelle: DB InfraGO AG Kalweit



Quelle: DB InfraGO AG Kalweit


Ausblick auf die nächsten Monate

Neubau | 2025

- Los 1 Abschluss Herstellung Pfeiler 2 (Schlepp- und Gleistragplatten)
- Abschluss Herstellung Rohbau Betriebsgebäude
- Fertigstellung Stützwand am Südufer
- Vergabe Los 2
- Erstellung Ausführungsplanung durch Bau-Auftragnehmer für Umsetzung Los 2 nach Vergabe
- Materialisierung Los 2
- Baubeginn Los 2 (vorbereitende Baumaßnahmen)
- Im Herbst ist geplant, die Behelfshalte auf der Südseite umzubauen, um Platz für den Oberbau zum Anschwenken der Brücke zu schaffen. Dadurch kommt es im September zu Einschränkungen im Zugverkehr. Die DB wird dazu informieren.

Europaweite Ausschreibung

Aktueller Stand im Verhandlungsverfahren

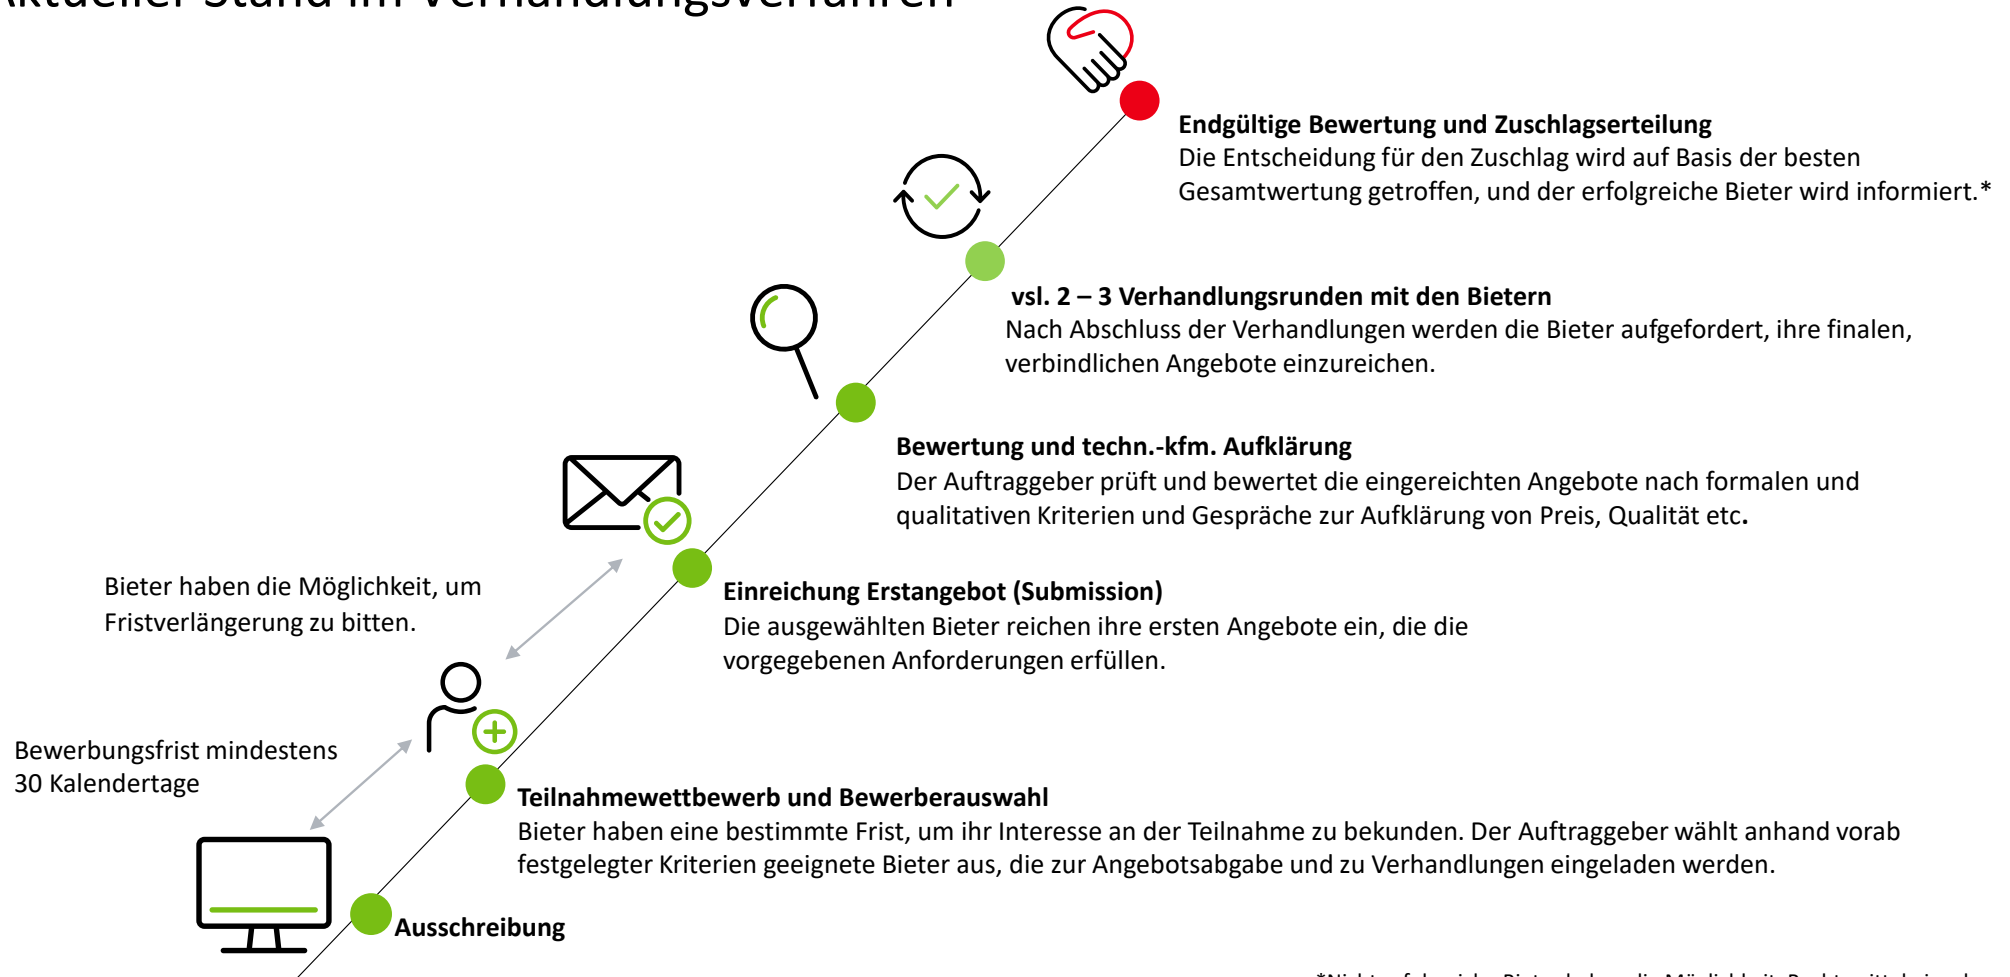

*Nicht erfolgreiche Bieter haben die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen, wenn sie der Meinung sind, dass das Verfahren fehlerhaft war.

Voraussichtliche Inbetriebnahme

Eisenbahnüberführung Schlei, Lindaunis

- Auf Basis der Submissionsergebnisse ist von einer Inbetriebnahme im Jahr 2027 auszugehen
- Nach Vergabe wird die Planung im Detail zwischen den Vertragsparteien optimiert und ein konkreter Bauablaufplan vom Bau-Auftragnehmer erarbeitet.
- Einflussfaktor Sperrung der Fahrrinne für Maritime Wirtschaft und Querungsmöglichkeit für Bahnfahrende, Anwohnende und Touristik werden in die Überlegungen mit einbezogen. Wir kommen auf die Beteiligten zu, um Prioritäten und Abläufe abzustimmen.

Schiffssaison 2025

Sonderöffnungen & Saisonstart

- Sonderöffnungen am Freitag, 21. und Samstag, 22. März 2025
- Saisonstart Freitag, 28. März 2025 | Saisonende Herbst 2025 | Acht Öffnungen täglich (10.30 Uhr, 11.30 Uhr, 12.30 Uhr, 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr)



InfraGO
